COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-TOU26062224

Client : HENGY SYLVAIN (284984)		**Contact : 0602003204**
Crée par JeanGuy PACINI	**le 29/09/2026**	**Expire le 20/10/2026**
13 IMPASSE DES ECOLES 13390 AURIOL		**Heure prévue : 07:00**

Notes

ATTENTION AU CONTRAINTE CI DESSOUS:
RESPECTER ITINERAIRE(AUTORISATION DE PASSAGE SENS INTERDIT) (GED)
HEURES ARRIVE ET DEPART ECOLE A PROXIMITE(GED)
CHEMIN PAVE CONSTATE PAR HUISSIER AVANT LIVRAISON
VOIR LONGUEUR TUYAU

Personne sur place

TEL:0602003204 CLIENT PAR TéLéPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 30m
Amorcage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce


Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

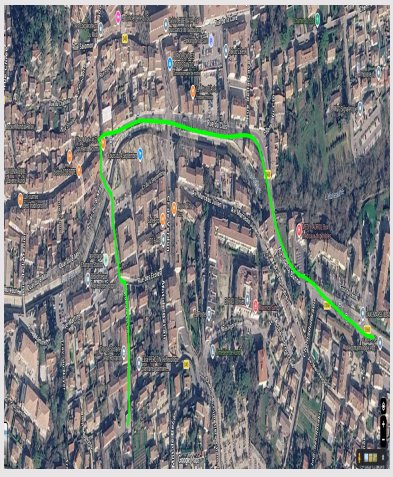

coulage villa individuelle

la municipalité oblige par rapport au tonnage un coulage avec pompe a tuyaux BQA

avec 30m de tuyaux plus ou moins client au courant que ce qui sera posé sera facturé et que au de la de 50m de tuyau un technicien est faturé aussi

livraison en 4x2 4x4 ok prévoir pour lavage goulotte toupie

lavage chantier pour pompe obligatoire

ATTENTION RESPECTER L'ITINERAIRE INDIQUE PAR LE CLIENT ET LA MAIRIE

LE CLIENT AURA LES AUTORISATION DE TONNAGE ET DE PASSER PAR LE SENS INTERDIT

ARRIVER PAR L'AUTOROUTE PRENDRE DIRECTION CENTRE ET SUIVRE

AV DE LA BANNE , RUE DU CLOS, QUAI DE L'HUVEAUNE AU TABAC A GAUCHE RUE DU DR FELIX LONG, PASSER SUR LE PONT, ALLES EN FACE PAR LE SENS INTERDIT BD DE LA REPUBLIQUE, PUIS RUE DES ECOLES SENS INTERDIT SAUF

	RIVERAIN

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	3
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	32
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	3
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	60
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	32
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	8
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	8
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 14/10/2026 à 11h16 par Fabien FERRARO.
